Vilhelm Kiers Kollegium
Udbudstidsplan
26.09.2018

FORVENTET UDFØRELSESTIDSPLAN

der kan forekomme ændringer

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1				
2				
3	**Udbud**	**88 days**	**Mon 24-09-18**	**Mon 04-02-19**
4	Upload af udbudsmateriale	1 day	Wed 26-09-18	Wed 26-09-18
5	Annoncering/prækvalifikation	26 days	Mon 24-09-18	Mon 29-10-18
6	Indstilling	6 days	Thu 01-11-18	Thu 08-11-18
7	Tilbudsperiode	29 days	Fri 09-11-18	Wed 19-12-18
8	Besigtigelse	1 day	Mon 19-11-18	Mon 19-11-18
9	Rettelsesblade	17 days	Thu 22-11-18	Fri 14-12-18
10	Licitation	1 day	Wed 19-12-18	Wed 19-12-18
11	Kontrahering	25 days	Thu 20-12-18	Mon 04-02-19
12				
13	**Udførelse**	**710 days**	**Tue 05-02-19**	**Thu 20-01-22**
14	Mobilisering og ordring af elementer	30 days	Tue 05-02-19	Mon 18-03-19
15	Renovering af blok 11	70 days	Tue 19-03-19	Thu 27-06-19
16	Renovering af blok 13	70 days	Thu 16-05-19	Wed 11-09-19
17	Renovering af blok 15	65 days	Wed 31-07-19	Tue 29-10-19
18	Renovering af blok 17	60 days	Tue 17-09-19	Mon 09-12-19
19	Renovering af blok 19	60 days	Mon 28-10-19	Wed 29-01-20
20	Renovering af blok 21	60 days	Fri 06-12-19	Tue 10-03-20
21	Sanktionsgivende deltermin	0 days	Tue 10-03-20	Tue 10-03-20
22	Renovering af blok 23	60 days	Tue 28-01-20	Thu 23-04-20
23	Renovering af blok 25	60 days	Mon 09-03-20	Wed 03-06-20
24	Renovering af blok 27	60 days	Wed 22-04-20	Tue 04-08-20
25	Renovering af blok 35	60 days	Tue 02-06-20	Mon 14-09-20
26	Renovering af blok 37	60 days	Mon 03-08-20	Fri 23-10-20
27	Renovering af fælleshus (nr. 47)	60 days	Thu 20-08-20	Wed 11-11-20
28	Renovering af blok 39	60 days	Fri 11-09-20	Fri 04-12-20
29	Santionsgivende deltermin	0 days	Fri 04-12-20	Fri 04-12-20
30	Renovering af blok 29	60 days	Thu 22-10-20	Thu 14-01-21
31	Renovering af blok 31	60 days	Thu 03-12-20	Wed 24-02-21
32	Renovering af blok 33	60 days	Wed 13-01-21	Fri 09-04-21
33	Renovering af blok 41	60 days	Tue 23-02-21	Thu 20-05-21
34	Renovering af blok 43	60 days	Thu 08-04-21	Wed 30-06-21
35	Renovering af blok 45	60 days	Wed 19-05-21	Tue 31-08-21
36	Renovering af blok 49	60 days	Tue 29-06-21	Mon 11-10-21
37	Renovering af blok 51	60 days	Mon 30-08-21	Fri 19-11-21
38	Renovering af blok 53	60 days	Fri 08-10-21	Thu 30-12-21
39	Reetablering	15 days	Fri 31-12-21	Thu 20-01-22
40	Afleveringsforretning	0 days	Thu 20-01-22	Thu 20-01-22

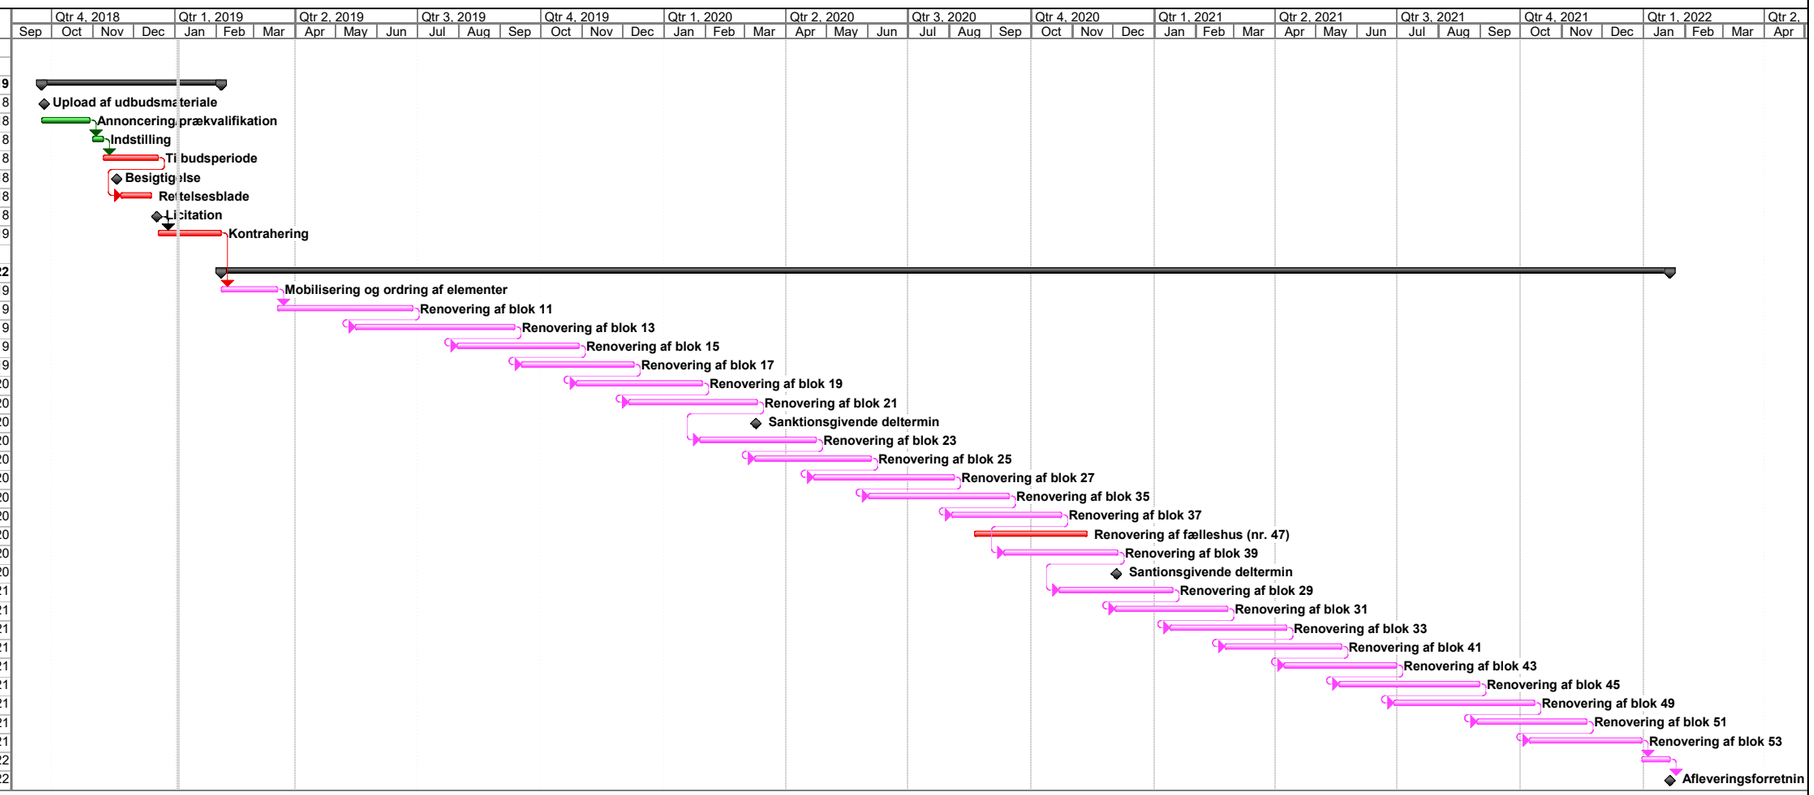

Project: Bilag 1_udkast tikl gennemføre
Date: Thu 03-01-19

Task		Progress		Summary		External Tasks		Deadline	
Split		Milestone		Project Summary		External Milestone			
